

半山芭巴剎的排水沟多年没有维修，部分已坍塌。



林钦喜（左）及蔡美丽巡视半山芭巴剎的基设提升与美化工程。

報道▸伍思薇、陳歡幸
攝影▸陳世偉

屢遇變數 只完成60%

半山芭巴剎拖遲變美



承包商目前在新巴剎路的垃圾房前进行沟渠加深及扩建工程。

（吉隆坡24日讯）半山芭巴剎提升与美化工程仅完成约60%，恐难兑现原定9月竣工目标，且工程或将延至年底！

吉隆坡市政局是于去年拨款450万令吉，为超过60年没有提升的半山芭巴剎进行基设提升与美化。

这项涉及沟渠加宽、排水系统提升以及行人走道重建等项目的工程于去年9月正式展开，预计今年6月竣工。

不过，《大都会》社区报记者日前在吉隆坡半山芭小贩小商公会主席林钦喜及秘书蔡美丽陪同下，巡视半山芭巴剎的基设提升与美化工程时，获悉工程或将延至年底。

突發狀況致進度放緩

蔡美丽指出，整体工程已完成约60%，但仍有多个部分尚未完工。她解释，工程初期因涉及拆除遮阳棚和需向多个吉隆坡市政局部门申请批准，曾一度停工数周。

“如今手续已完成，拆除工作也已处理，目前承包商正在新巴剎路的垃圾房前继续施工。”

“不过，由于半山芭巴剎一带的环境复杂，工程进行期间不时会遇到新的阻碍，例如地下设施、排水问题或其他突发投诉，导致进度有所放缓。”

她透露，部分原本不在计划内的区域，因小贩投诉积水问题，也被纳入施工范围。

这些新增工程虽然有助于改善环境，但也让完工时间难以准确预测，原定在今年9月完工的目标，或许需要延至今年底，甚至更久。

她说，目前仍未完成的部分包括巴剎四周的新巴剎路、通往钟万仙师庙一带的路段，以及延伸至Richmoore Hotel的路段。

小贩给予配合照样营业

她强调，虽然施工进度延宕，但大多数小贩都给予配合，也理解提升工程最终是为了整体环境更好，因此即便施工期间造成不便，他们也选择继续营业，并未要求停业休息。

她表示，有关工程除了扩建排水沟，市政局也计划在沟渠完工后铺设道路，以解决该巴剎长期存在的路面破损问题。

不过，这项铺路工程必须等待主要排水系统完成提升后才能展开，以避免重复施工。

溝窄無法負荷雨量


蕉赖国会议员陈国伟的助理蔡珍莉表示，上述工程原定于今年9月竣工，但由于进展一再延迟，也令人担忧能否如期完工。不过，在他们与市政局相关部门在最近一次的协调会议上，官员明确表示，该工程必须在今年内完工，他们及市政局也会督促承包商加快进度。

她透露，在提升工程进行期间，承包商也发现地下埋藏着一些老旧的电线与水管，他们需更小心处理及挖掘，才能顺利扩建排水系统，也需耗费更多时间。此外，巴剎长期存在垃圾管理不当的问题，许多垃圾堵塞排水口，导致水流不畅与频频积水。

半山芭巴剎原有的沟渠过于浅窄，无法负荷如今的雨量，因此必须加深及扩建。如今排水沟已加深扩建，若小贩没有改善处理垃圾的方式，水灾与卫生问题仍难根治。

因此，她也呼吁小贩要更加注重清洁卫生，避免随意丢弃垃圾或倾倒污水，否则将破坏整体环境，令工程效果大打折扣。

她补充，半山芭巴剎是吉隆坡最大的露天巴剎，若能妥善完成提升与美化工程，并改善卫生与排水问题，不仅能为本地居民提供更舒适的环境，也有望吸引更多客源前来，带动当地经济与商机。

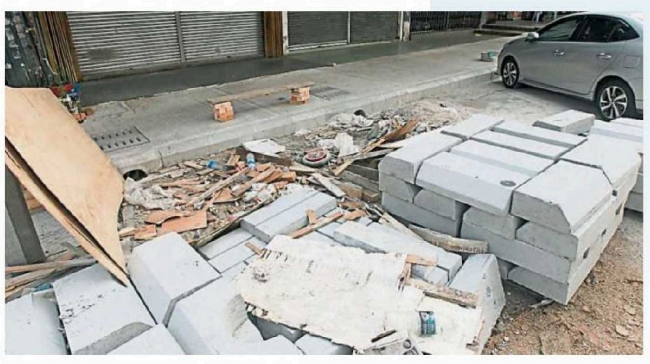

承包商将部分建材堆放在路边停车位的行为已占用空间，导致停车位减少。



为了改善排水问题，承包商将原本狭窄的排水口扩建成更宽敞的出水口，以负荷更大量的雨水与污水。



徐小姐（豬肉販）：施工期生意沒受影響

“过去只要下起大雨，这一带（金鱼街旁边巷子）因为地势较低，经常发生闪电水灾。

目前，我档口附近的沟渠提升工程已全数完工。但由于完工至今还未遇到大雨，所以我也无法判断提升后的沟渠能否真正发挥防洪的作用。

施工期间，我的生意并没有受到影响，承包商和我们进行各自的工作，互不干扰。”




李錦威（魚販）：攤位移前讓路施工

“提升工程目前还未进行到我的摊位附近，因此暂时没有受到影响。不过，我摊位附近最大的问题是沟渠经常堵塞及堆满垃圾。

而这个沟渠最后一次进行清理工作，还是在行动管制令期间的巴剎大扫除，之后就再没有被清理过。因此，我希望当局能尽快完成我这一带的沟渠提升工程。

待施工进行到我这一带时，我会把摊位往前移，让他们顺利作业，并尽量给予配合，同时不会因此暂停营业。

对我来说，这项提升工程是为大家好，只有互相体谅，工程才能顺利完成，最终达到双赢。”



黄友基（麵販）：擺檔四周沒嚴重水災

“在我摆档的四周并未出现过严重的闪电水灾问题。

不过，这项工程对我的影响也不大，只需要将摊位物品稍作搬移即可。

承包商在工程期间也有妥善处理废弃物，加上很多时候他们施工时，正好是我休息的时候，因此几乎没有对营业造成影响。

虽然目前还无法确定完工后是否真能带来改善，但我依然期望这项工程能发挥作用，为半山芭巴剎塑造一个更好的环境。”
